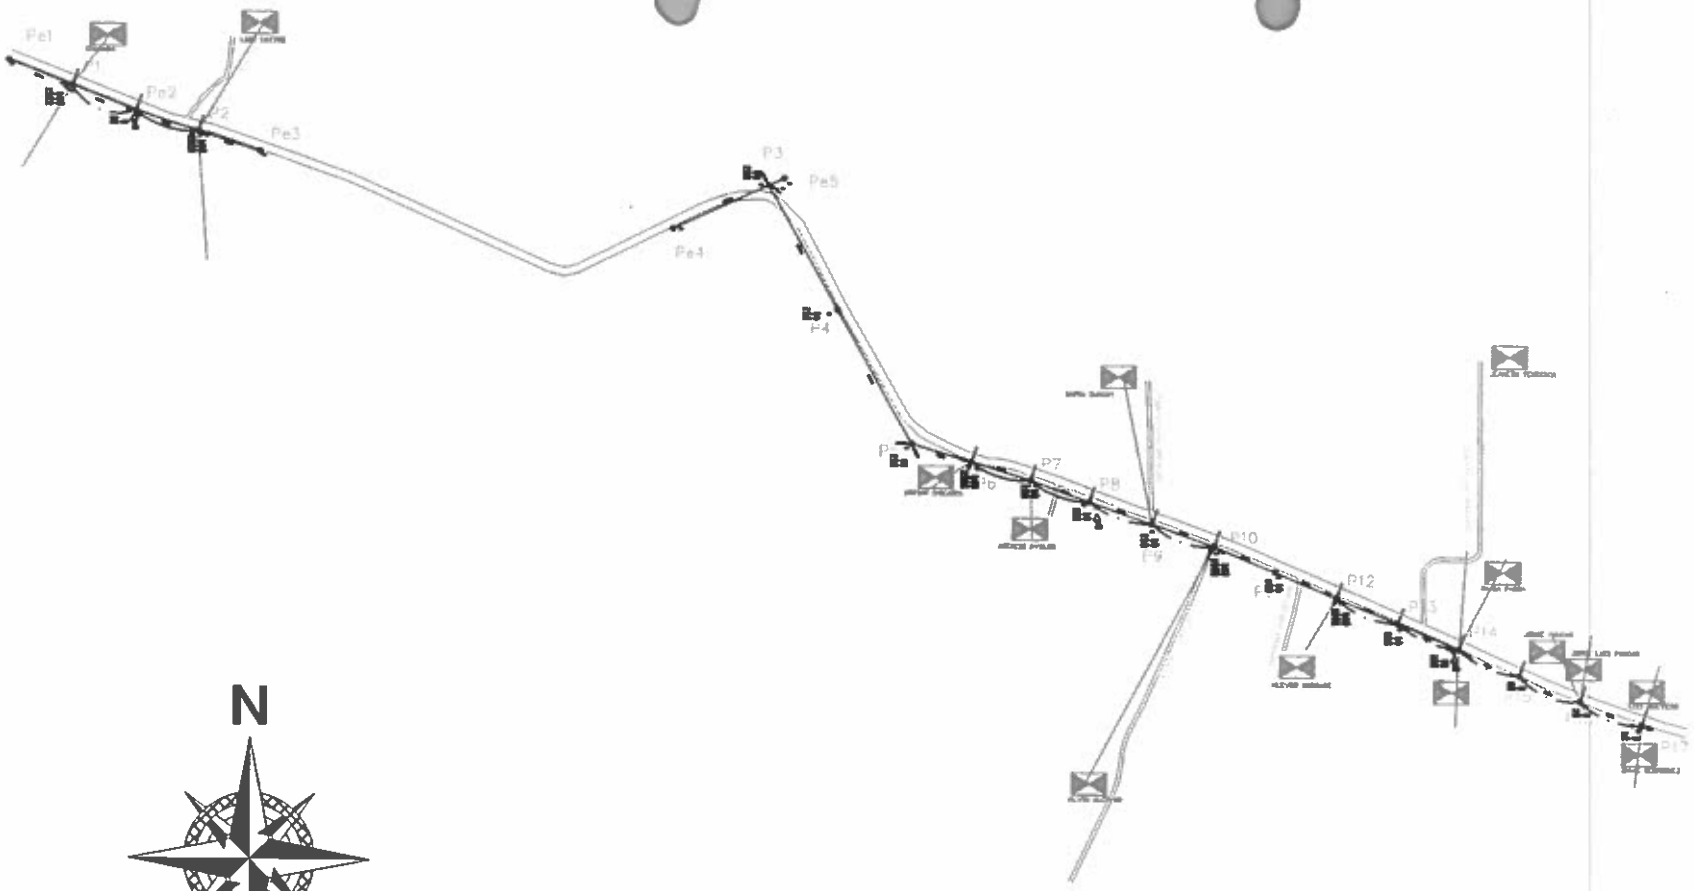

N

CNEL EP		DIBUJO:	PROYECTO No:
PROYECTO: NUEVA ESPERANZA	PARROQUIA: LUMBAQUI	ESCALA: 1 — 200	FECHA:
REVISO:	GONZALO PIZARRO	REFERENCIA:	HOJA: 1 DE 1
RECOMENDO:	RED DE DISTRIBUCION LÍNEA 1ø MEDIA–BAJA TENSIÓN	OFICINA:	COORD. EN X: / COORD. EN Y:
APROBO CNEL-SUC:	TIPO DE INSTALACION: AEREA — TENSION 13.8 /7.9 KV	SUBESTACION:	No.
		PRIMARIO:	FACTIBILIDAD No.

CNEL EP

CNEL EP - SUCUMBIOS

HOJA DE ESTACAMIENTO DE RED CONSTRUIDA

DEPARTAMENTO: TECNICO
SECCION: DISTRIBUCION
PROYECTO: ELECTRIFICACION NUEVA ESPERANZA

PROVINCIA: SUCUMBIOS
CANTON: GONZALO PIZARRO
PARROQUIA: LUMBAQUI

CONTRATO: DIRECTO
PARTIDA PRESUPUESTARIA:
SUBPROGRAMA: 0

CONTRATISTA: ADMINISTRACION DIRECTA
FISCALIZACION: ADMINISTRACION DIRECTA

FECHA: 03-dic-17

RETIRO
CONSTRUCCION: EES

NUM	POSTES COD EMP	POSTES TIPO VOLTAJ	POSTES ALTURA	RED PRIMARIA TIPO ESTRUCT			RED PRIMARIA NUM CALIB	RED PRIMARIA NAMO	NOMPLAE EQUIPOS SECC	NOMPLAE EQUIPOS PARARR	NOMPLAE EQUIPOS NUM	NOMPLAE EQUIPOS POT. TIPO	RED SECUNDARIA TIPO ESTRUCT							RED SECUNDARIA NUM CALIB	RED SECUNDARIA NAMO	A.P. POT. TIPO	PUESTA A TIERRA	TENSORES							PASO ACOM. USUA	PASO ACOM. ACOM	PUENTE AÉREO	OBSERVACIONES	COORDENADAS X	COORDENADAS Y
1	P6 1	PCB-9HC11 500																																		
2	P1	PCB-9HC12 500	90 0	EST 1CP									ESE 1ER	ESD 3ER																						
3	P6 2	PCB-9HC11 500	90 0																			APC-9PLCS160PCC	PT6-9PC2 1	TAD-9TS												
4	P2	PCB-9HC12 500	77 0	EST 1CP								TRT 1A6	ESD 3EP								ACSR 3X1/0	80 0	APC-9PLCS160PCC	PT6-9PC2 1											
5	P6 3	PCB-9HC11 500	77 0										ESE 1ER	ESD 3ER							ACSR 3X1/0	77 0	APC-9PLCS160PCC	PT6-9PC2 1	TAD-9TS											
6	P6 4	PCB-9HC11 500																																		
7	P6 5	PCB-9HC11 500	140 0																																	
8	P3	PCB-9HC12 500		EST 1CR			ACSR 1X1/0		BPT 15 1KB				ESE 1ER								ACSR 1X1/0															
9	P4	PCB-9HC12 500	100 1	EST 1CP			ACSR 1X1/0	100 1					ESE 1EP								ACSR 1X1/0	100 1			TAT-9TD										
10	P5	PCB-9HC12 500	102 2	EST 1CD			ACSR 1X1/0	102 2					ESE 1CD								ACSR 1X1/0	102 2			TAT-9TD	TAT-9TD									
11	P6	PCB-9HC12 500	75 0	EST 1CP			ACSR 1X1/0	75 0					ESE 1ER	ESD 3ER							ACSR 3X1/0	75 0	APC-9PLCS160PCC	PT6-9PC2 1	TAD-9TS							FUS	1AC				
12	P7	PCB-9HC12 500	74 7	EST 1CP			ACSR 1X1/0	74 7					ESD 3EP								ACSR 3X1/0	74 7	APC-9PLCS160PCC									FUS	1AC				
13	P8	PCB-9HC12 500	75 0	EST 1CP			ACSR 1X1/0	75 0				TRT 1A6	ESD 3EP								ACSR 3X1/0	75 0	APC-9PLCS160PCC	PT6-9PC2 1												
14	P9	PCB-9HC12 500	80 5	EST 1CP			ACSR 1X1/0	80 5					ESD 3EP								ACSR 3X1/0	80 5	APC-9PLCS160PCC													
15	P10	PCB-9HC12 500	80 0	EST 1CP			ACSR 1X1/0	80 0					ESE 1ER	ESD 3ER							ACSR 3X1/0	80 0	APC-9PLCS160PCC	PT6-9PC2 1	TAD-9TS							FUS	1AC				
16	P11	PCB-9HC12 500	80 0	EST 1CP			ACSR 1X1/0	80 0					ESE 1EP								ACSR 1X1/0	80 0														
17	P12	PCB-9HC12 500	80 0	EST 1CP			ACSR 1X1/0	80 0					ESE 1ER	ESD 3ER							ACSR 3X1/0	80 0	APC-9PLCS160PCC	PT6-9PC2 1	TAD-9TS							FUS	1AC				
18	P13	PCB-9HC12 500	80 0	EST 1CP			ACSR 1X1/0	80 0					ESD 3EP								ACSR 3X1/0	80 0	APC-9PLCS160PCC													
19	P14	PCB-9HC12 500	80 0	EST 1CR			ACSR 1X1/0	80 0				TRT 1A6	ESD 3EP								ACSR 3X1/0	80 0	APC-9PLCS160PCC	PT6-9PC2 1	TAT-9TD							3US	2AC				
20	P15	PCB-9HC16 400	80 0										ESD 3EP								ACSR 3X1/0	80 0	APC-9PLCS160PCC													
21	P16	PCB-9HC16 400	80 0										ESD 3EP								ACSR 3X1/0	80 0	APC-9PLCS160PCC									3US	2AC				
22	P17	PCB-9HC16 400	80 0										ESD 3ER								ACSR 3X1/0	80 0	APC-9PLCS160PCC	PT6-9PC2 1	TAD-9TS							3US	2AC				
